

7 de diciembre de 2018

REPORTE

Actividades realizadas:

1.- Se presentaron 2 albañiles a trabajar en las instalaciones de lo que sera el nuevo almacen el cual se encuentra en remodelacion haciendo un tiempo estimado entre ambas personas de un aproximado de 15horas (no se pudo supervisar la obra todo el tiempo), en el cual fue supervisado en algunas ocasiones por el señor Oscar (maestro de obra).

2.- Se contactaron 3 empresas dedicadas a la compra de metales, en las cuales las 3 pagaban el precio de 3 pesos por kilogramo, se eligio a la empresa de Enrique Becerrera ubicada en la 9ª sur poniente ya que dicha empresa mostro mas seriedad y no puso condicionantes para ir por la recoleccion del material, en el caso de las otras 2 empresas ofrecian dicho precio si fierro se iba a dejar a sus instalaciones.

3.- Se supervisaron de manera esporadica los trabajos realizados por los albañiles con la finalidad de presionar e informar de los avances al lic. Raul via whatsapp.

4.- Se compro llanta para la carretilla la cual fue enviada de Laureles ya con la llanta baja tiene conocimiento Victor Dionicio, por lo cual se opto por la compra de una llanta nueva con costo de \$104.21

Reporte de actividades a realizar:

1.- Se seguiran con las labores de demolicion el dia sabado 8 de diciembre ya que no se han concluido, se tiene pendiente la demolicion de los baños y tanques, asi como la pared aladaña de atrás.

2.-Se agendo la llegada de 2 a 3 camiones para el retiro de escombros los cuales comenzaran labores a partir de las 6:30 am el 8 de diciembre, por lo cual pedire apoyo con el vigilante de Matriz para supervisar que unicamente se lleven el material de escombros en dichos camiones en lo que llega su servidor para supervisarlos. Les comento tienen horario limite 09:00 am para retiro de material para no afectar las labores del negocio.


3.- Recoleccion de la empresa recicladora para la compra del fierro en horarios de 9:00 a 10:00 am

4.- Pago de mano de obra al señor Oscar Pascacio (se adjunta presupuesto para visto bueno del lic.. Raul).

Fotografía de los avances realizados



Presupuesto del señor Oscar:

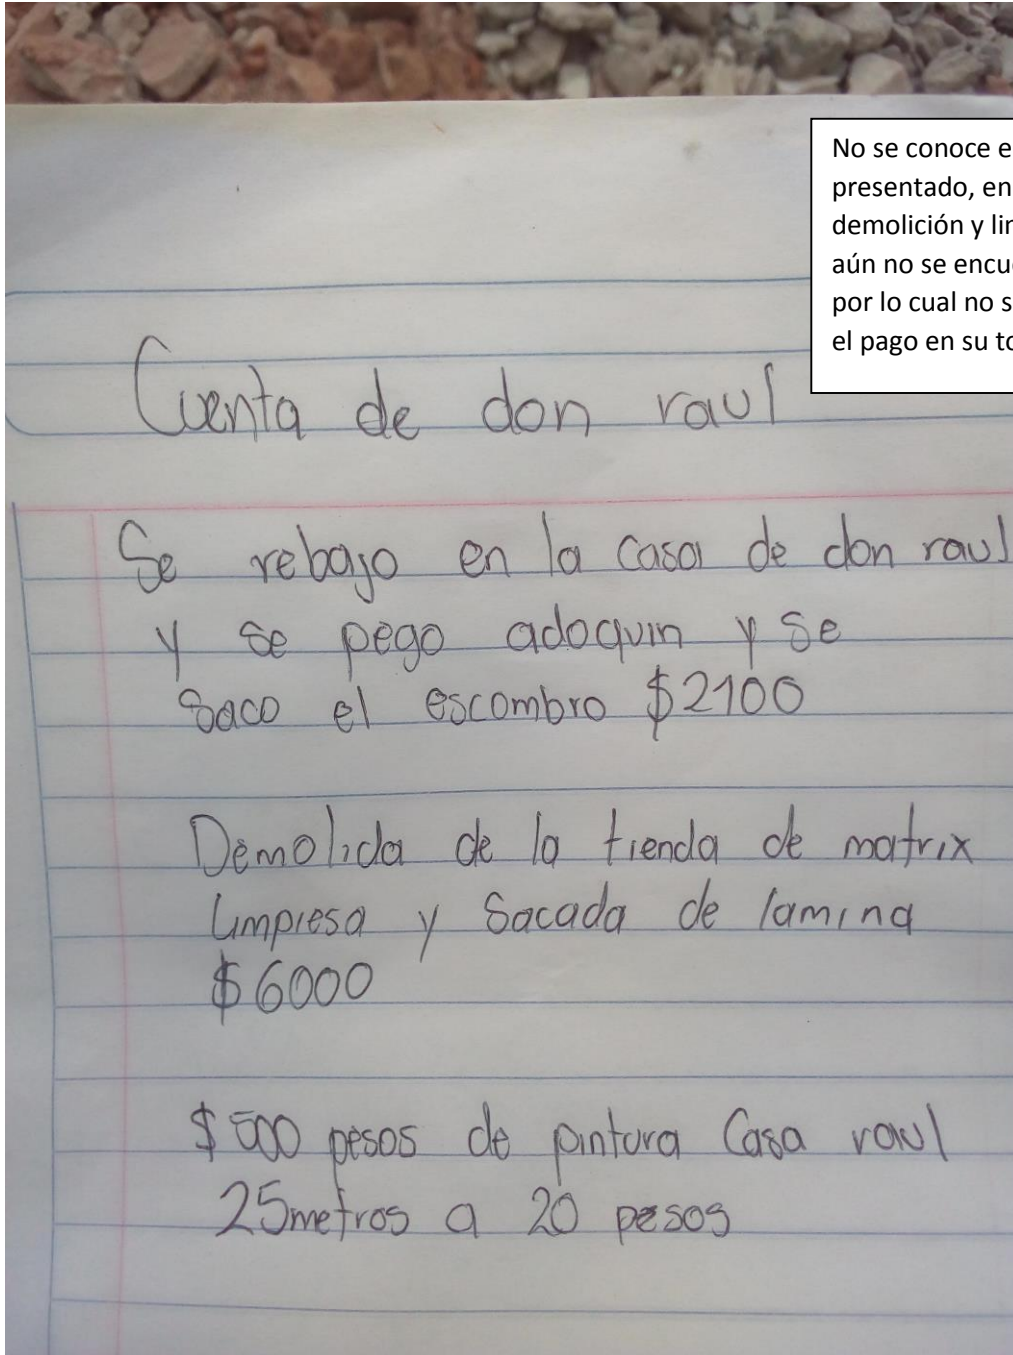

No se conoce el presupuesto inicial presentado, en el caso de la demolición y limpieza los trabajos aún no se encuentran terminados, por lo cual no se ve viable realizar el pago en su totalidad.

SUPERVISOR

PARA CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL

ING. MAURO ERICK DE LA CRUZ RIOS

LIC. RAUL LEON LIMON
